


1. EDT Ordenado jerárquicamente

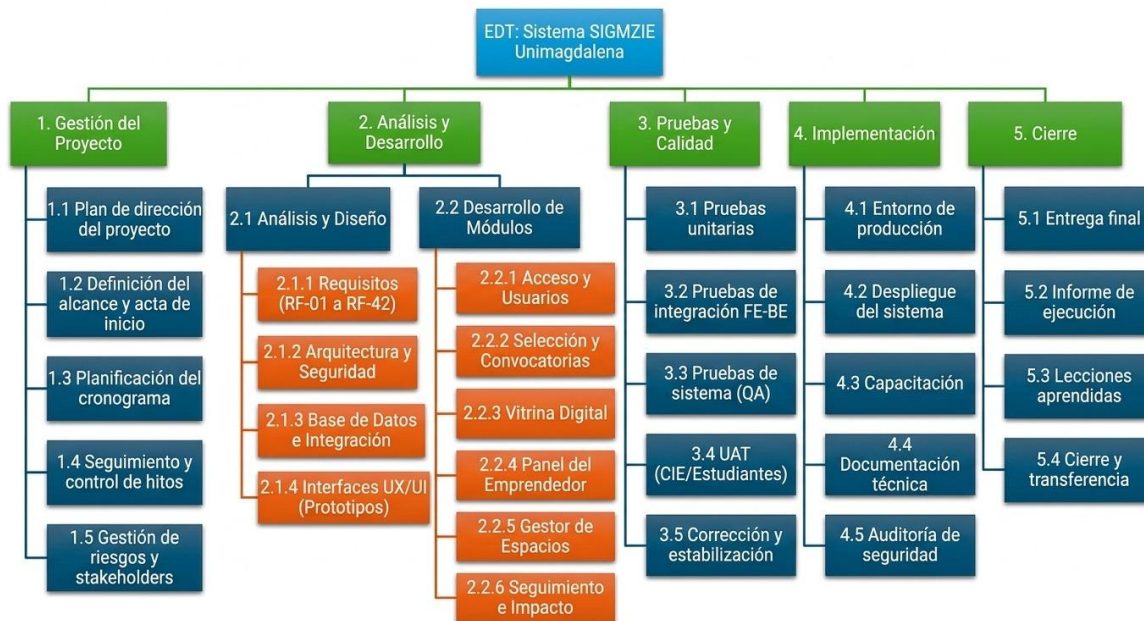

2. Diccionario EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Entregables	Criterios de aceptación	Responsable	Duración
1,1	Plan de dirección del proyecto	Documento base para la gestión del proyecto, incluyendo metodología, roles, comunicaciones y control.	Plan del proyecto aprobado.	Está completo, aprobado por los interesados y alineado con el alcance.	Director del proyecto	1 semana
1,2	Definición del alcance y acta de inicio	Formalización del proyecto, objetivos, límites, supuestos y restricciones.	Acta de inicio y alcance definido.	El alcance está validado y no presenta ambigüedades.	Director del proyecto / patrocinador	1 semana

1,3	Planificación del cronograma	Organización de actividades, secuencia, hitos y tiempos del proyecto.	Cronograma detallado.	Incluye todas las actividades, dependencias e hitos principales.	Director del proyecto	1 semana
1,4	Seguimiento y control de hitos	Monitoreo del avance frente al cronograma y control de desviaciones.	Informes de avance y control de hitos.	Los hitos están trazados y se evidencian avances medibles.	Director del proyecto	Todo el proyecto
1,5	Gestión de riesgo y stakeholders	Identificación de riesgos y análisis de interesados con su respectivo plan de gestión.	Matriz de riesgos y registro de stakeholders.	Los riesgos están clasificados y los interesados priorizados.	Director del proyecto	1 semana
2.1.1	Requisitos (RF-01 a RF-42)	Levantamiento y validación de requisitos funcionales y no funcionales.	Documento de requisitos.	Los requisitos están completos, claros, priorizados y validados.	Analista de requisitos / equipo funcional	2 semanas
2.1.2	Arquitectura y seguridad	Diseño de la arquitectura del sistema y mecanismos de seguridad.	Arquitectura lógica y técnica, lineamientos de seguridad.	La arquitectura soporta los requisitos y cumple principios de seguridad.	Arquitecto de software / líder técnico	2 semanas
2.1.3	Base de datos e integración	Diseño del modelo de datos e integración con otros sistemas o servicios.	Modelo entidad-relación, scripts SQL, integración definida.	El modelo es consistente, normalizado y soporta las funcionalidades.	Desarrollador backend / DBA	2 semanas
2.1.4	Interfaces UX/UI (Prototipos)	Diseño de pantallas, flujos y experiencia de usuario.	Wireframes, mockups y prototipos navegables.	Los prototipos son comprensibles, coherentes y aprobados por usuario clave.	Diseñador UX/UI	2 semanas

2.2.1	Acceso y usuarios	Módulo de autenticación, registro, perfiles y control de roles.	Módulo funcional de usuarios y autenticación.	Permite iniciar sesión, registrar usuarios y controlar permisos correctamente.	Desarrollador full stack	1 semana
2.2.2	Selección y convocatorias	Gestión de convocatorias, postulación y proceso de selección.	Módulo de convocatorias y selección.	Permite crear, publicar, postular y revisar convocatorias sin errores.	Desarrollador full stack / analista funcional	2 semanas
2.2.3	Vitrina digital	Espacio para mostrar emprendimientos, productos o servicios.	Módulo de vitrina digital.	La información se visualiza correctamente y es fácil de consultar.	Desarrollador frontend / backend	1 semana
2.2.4	Panel del emprendedor	Área privada para que el emprendedor gestione su información y avance.	Panel de control del emprendedor.	El usuario puede consultar y actualizar su información y estado.	Desarrollador full stack	2 semanas
2.2.5	Gestor de espacios	Administración de espacios físicos o virtuales disponibles.	Módulo de gestión de espacios.	Permite registrar, consultar y asignar espacios correctamente.	Desarrollador backend / funcional	1 semana
2.2.6	Seguimiento e impacto	Registro y análisis de indicadores del proyecto o de los emprendimientos.	Reportes e indicadores de seguimiento.	Los datos se muestran de forma confiable y permiten análisis básico.	Analista de datos / desarrollador backend	1 semana
3,1	Pruebas unitarias	Validación individual de componentes y módulos del sistema.	Casos de prueba y resultados de pruebas unitarias.	Cada módulo crítico pasa las pruebas sin fallos relevantes.	Equipo de desarrollo / QA	1 semana


3,2	Pruebas de integración	Validar la interacción entre módulos front-end y back-end y servicios	Reporte de pruebas de integración	0 errores críticos	QA Engineer	3 sem
3,3	Pruebas de sistema (QA)	Validar la interacción entre módulos front-end y back-end y servicios	Reporte de pruebas del sistema	Cumplimiento total de requisitos	QA Engineer	2 sem
3,4	UAT (CIE/Estudiantes)	Evaluar el sistema completo respecto a requisitos funcionales y no funcionales Reporte de pruebas del sistema Cumplimiento total de requisitos	Reporte de pruebas de integración	0 errores críticos	QA Engineer	3 sem
3,5	Corrección y estabilización	Validar el sistema con usuarios finales en entorno real	Reporte de pruebas del sistema	Cumplimiento total de requisitos	QA Engineer	2 sem
4,1	Entorno de producción	Corregir errores y optimizar el rendimiento del sistema	Acta de aceptación UAT firmada	Aprobación formal del usuario	Líder de Proyecto	2 sem
4,2	Despliegue del sistema	Configurar infraestructura para despliegue del sistema	Informe de correcciones y versión estable	Sin fallos críticos	Equipo de Desarrollo	2 sem
4,3	Capacitación	Publicar el sistema en producción	Entorno configurado	Entorno validado sin errores	DevOps	1 sem
4,4	Documentación técnica	Capacitar usuarios finales en el uso del sistema	Sistema desplegado y accesible	Sistema funcionando correctamente	DevOps / PM	1 sem

4,5	Auditoría de seguridad	Elaborar documentación técnica del sistema	Manual de usuario, sesiones de capacitación	Satisfacción $\geq$ 80%	Líder Funcional	2 sem
5,1	Entrega final	Entregar formalmente el sistema al cliente	Manual técnico y documentación	Documentación aprobada	PM / Analista	2 sem
5,2	Informe de ejecución	Documentar resultados del proyecto	Informe de ejecución	Aprobación del sponsor	Project Manager	1 sem
5,3	Lecciones aprendidas	Registrar aprendizajes y mejoras del proyecto	Informe de ejecución	Aprobación del sponsor	Project Manager	1 sem
	Cierre y transferencia	Transferir el sistema y cerrar el proyecto	Acta de cierre y documentación	Aprobación del cliente	PM / Operaciones	1 sem

3. Matriz foda



4. Matriz came

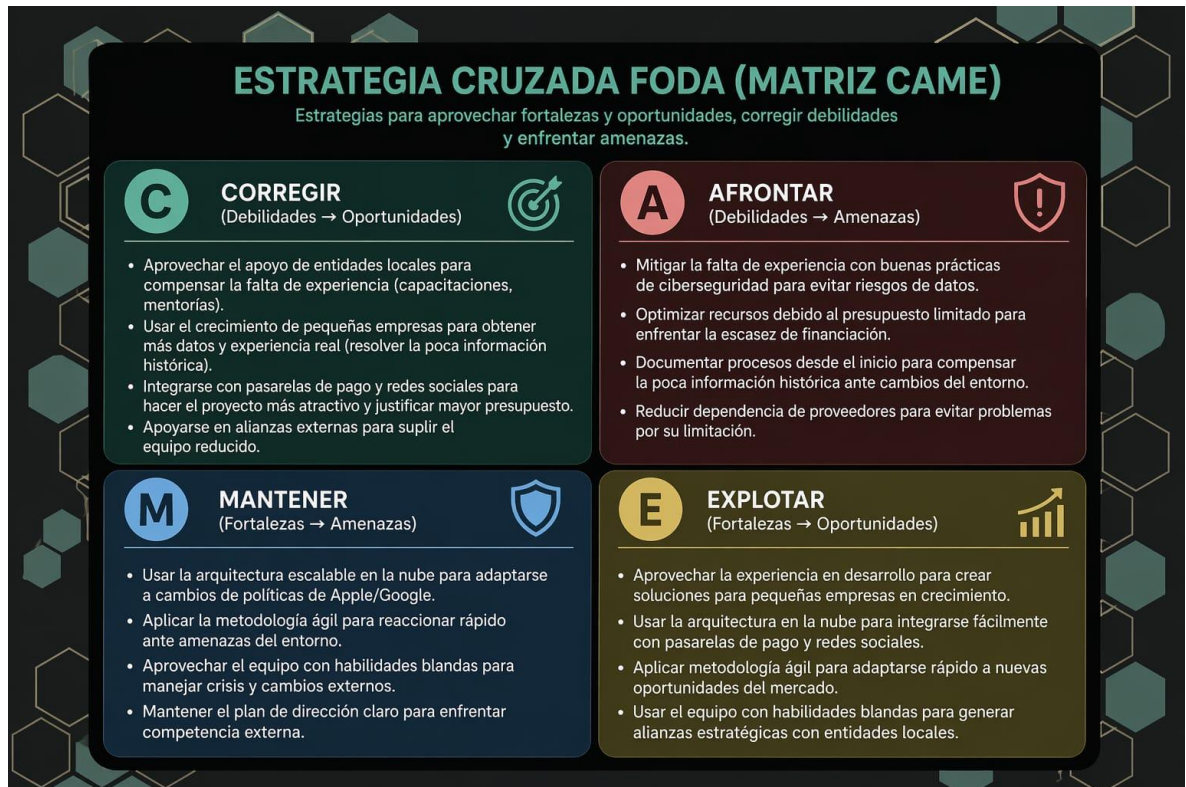

5. Interpretación

En primer lugar, el impacto más directo se observa en la gestión de las limitaciones internas. Al identificar debilidades críticas como un presupuesto estricto (\$126.523.794 COP) y un equipo humano reducido, la planeación se ve obligada a abandonar la idea de un desarrollo masivo inicial para centrarse en un Producto Mínimo Viable (MVP). Esto ha permitido que la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) priorice los módulos esenciales de validación, mientras que la estrategia de "corregir" del CIDS propone suplir la falta de experiencia mediante mentorías y alianzas con el Centro de Innovación (CIE), integrando estas actividades directamente en el cronograma de ejecución.

En segundo lugar, el análisis ha permitido blindar el proyecto ante amenazas externas. La identificación de riesgos de ciberseguridad y la estricta normativa de Habeas Data no se quedaron solo en el papel; estas preocupaciones forzaron la inclusión de hitos técnicos específicos en la fase de

implementación, tales como la auditoría de seguridad (nodo 4.5) y el uso de una arquitectura escalable en la nube (Azure/AWS). De este modo, la planeación técnica responde proactivamente a la posibilidad de ataques o cambios repentinos en las políticas de las plataformas digitales

Finalmente, la sinergia entre las fortalezas del equipo y las oportunidades del entorno ha definido el carácter innovador de la plataforma. Al explotar la metodología ágil y la capacidad de integración cloud, el plan de dirección no se limita a un sistema administrativo interno, sino que proyecta la vinculación con pasarelas de pago y redes sociales

6. Distribución de responsabilidades

Camilo monsalve	EDT Y Interpretacion
Alvaro leyva	Matriz FODA
Alvaro Ospino	Diccionario EDT
Daniel rangel	Diccionario EDT
Lilia maldonado	Matriz CAME
